



Vandentiekis kameros
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius (N. Vilnia) Gerovis
 (Miestas) (Gatvė) Nr. () 111 KORTELE
4276
 (Planšto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Matmens duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis

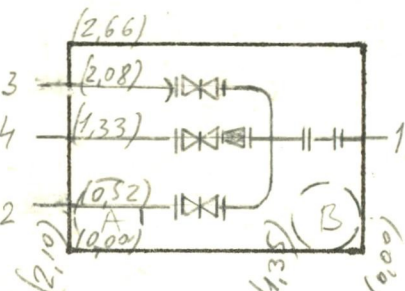

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

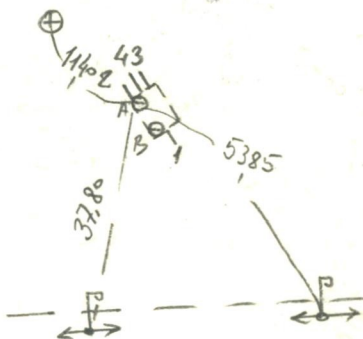

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .. <i>ko. bet.</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		139,47	
Žemė			0,00	139,47	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	2,66x2,19	3,20	136,27	Pastaba: <i>B) požemie</i> <i>?) 3) futuaroje plot. 300</i> <i>... 12m už kameros.</i>
Vamzčiai	Nr. 1	KET	300	Viršus 2,60 Apačia 136,87	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	PE	250	Viršus 2,60 Apačia 136,87	
	Nr. 3	PE	250	Viršus 2,60 Apačia 136,87	Objekto Nr. <i>01-2-11163</i>
	Nr. 4	PE	160	Viršus 2,67 Apačia 136,80	
	Nr. 5			Viršus Apačia	Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	Patikrinė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) 2,003 m..... mėn. <i>11.11</i> (Inginio tyrinėjimo data)
