
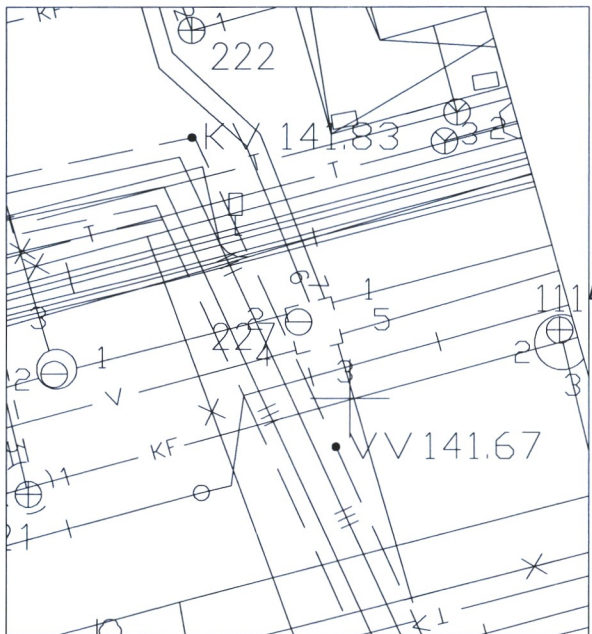
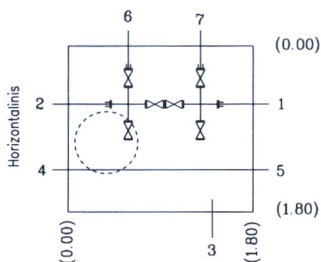


ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pagadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipnės kopėčios (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Ketus	650			142.78	Ar yra vandens _____	
Žemė				0.00		142.78	Ar yra dujų _____	
Sienos		g/b					Pastabos X = 6061012.85; Y = 581557.59	
Dugnas		Betonas	1800x1800	2.52		140.26	LASOZ	
Vamzdžiai				Viršus	2.24	140.54	UAB "GEOMANAI"	
	Nr. 1	Ketus	100	Apačia				
				Viršus	2.24	140.54		
				Apačia				
	Nr. 2	Ketus	100	Viršus	2.24	140.54	Objekto nr. _____	
				Apačia				
	Nr. 3	Ketus	200	Viršus	2.24	140.54		
				Apačia				
	Nr. 4	Ketus	200	Viršus	2.12	140.66	Sudarė _____ D.Katilius	
				Apačia				
	Nr. 5	Ketus	200	Viršus	2.12	140.66		
				Apačia				
	Nr. 6	PE	110	Viršus	2.24	140.54	Patikrino _____ Parašas _____ Pavardė _____	
				Apačia				
	Nr. 7	PE	110	Viršus	2.24	140.54		
				Apačia				
Nr. 8			Viršus			2016-04-27 (jrenginio tyrinėjimo data)		
			Apačia					
