

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 44 195

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Artvarų g.
(gatvė)



33-13-11
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalūs

Horizontalūs



$$X = 6072605,59$$

$$Y = 587404,08$$

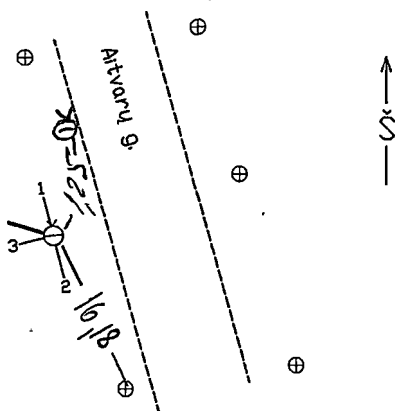

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	130,29	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,29	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus 2,09	128,20
				Apačia	
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus 2,09	128,20
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 2,15	128,14
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
					AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objektas: 01-2-13019
					Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
					Patikrino V. Augonas (parašas) (pavardė)
					2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
