

(Komunikacija)

(jrenginio pavadinimas)

(Miestas)


(Gatvé)

Nr.(70-A-14) 88 KORTELE

(Planšeto nomenklatūra)

(Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

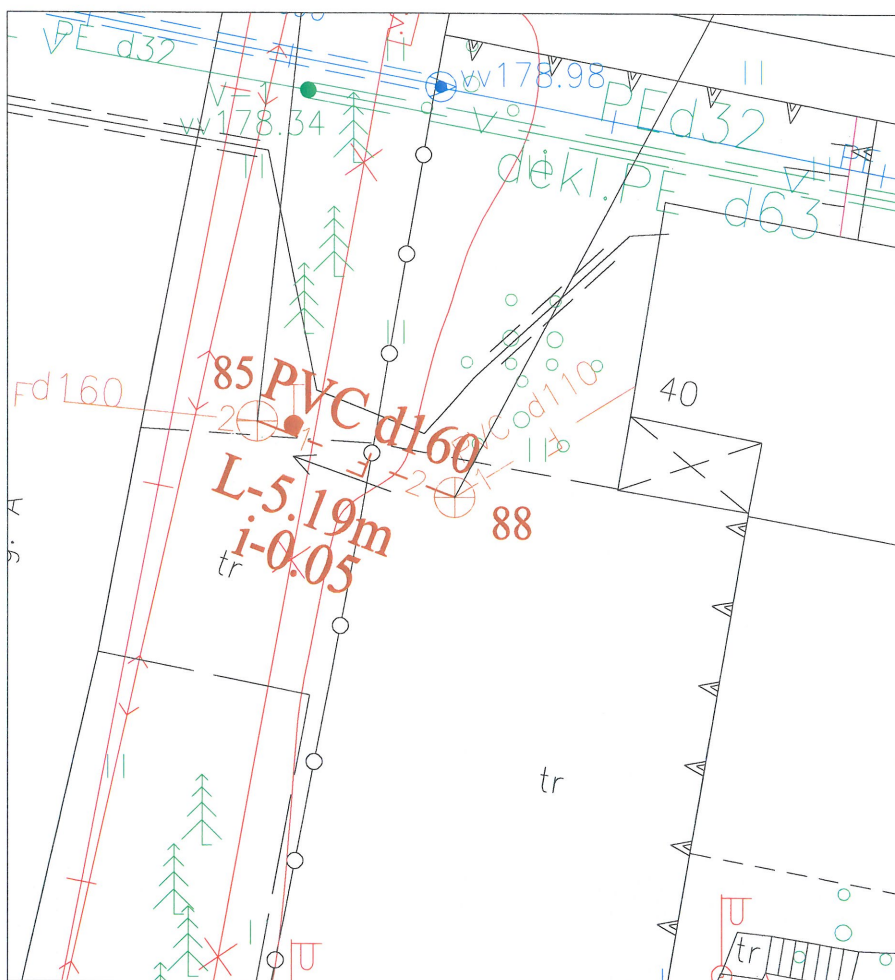

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	650			180.590
Žemė		Cementas		0.00		180.59
Sienos		Betonas				
Dugnas		Gruntas	1500	2.60		177.99
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus	1.20	179.39
				Apačia	1.31	179.28
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.42	179.17
				Apačia	1.58	179.01
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės —
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens —

Ar yra dujų _____
Pastabos $X = 6068421.56$; $Y = 580104.70$

UAB "Inžinerijos centras"

Objekto nr.

Parašas

Pavardé

Patikrino

Parašas

Pavardé

2019-11-20

(įrenginio tyrinėjimo data)
