

Liet. nuot. tinkl., dren.

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys

(įrenginio pavadinimas)

3

(įrenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Pavilnionių g.

(adresas)


75330234

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis

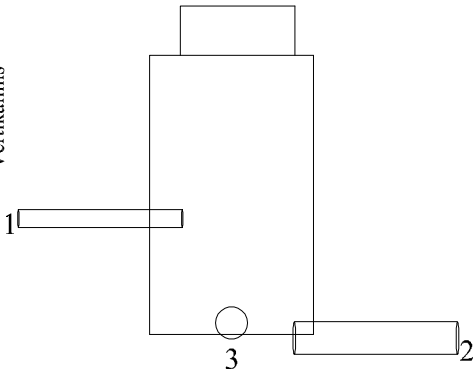

Horizontalinis

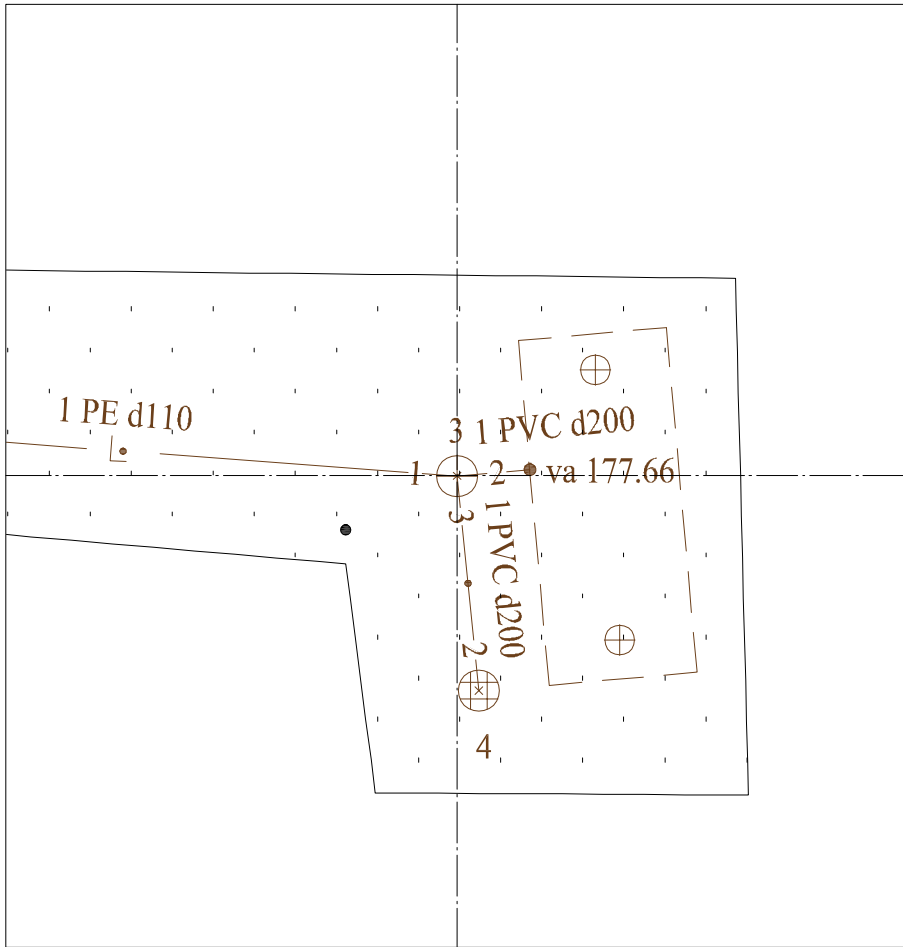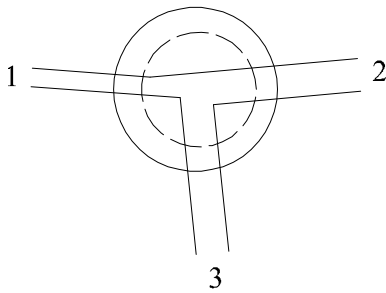

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: <u>X = 6067202.98; Y = 578262.94</u> _____ _____ _____ _____ _____
Dangtis		ket	650				179.40	
Žemė					0.00		179.40	
Sienos		glžb						
Lubos		glžb	1000		0.68		178.72	
Dugnas		bet	1000		1.60		177.80	Objektas: _____ _____ _____
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	110	Viršus			
			Vidinis		Apačia	1.08	178.32	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			
			Vidinis		Apačia	1.70	177.70	
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus			
			Vidinis		Apačia	1.57	177.83	
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1813 (geodazinis kv.paž.Nr.)	<i>Alihui</i> (parašas)	2023-10-24 (data)
Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-221 (geodazinis kv.paž.Nr.)	<i>D. Katilius</i> (parašas)	2023-10-24 (data)
Matavimus atliko			
