

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

105
(įrenginio numeris)


Liepkalnio g., Vilnius
(adresas)

76310137
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis

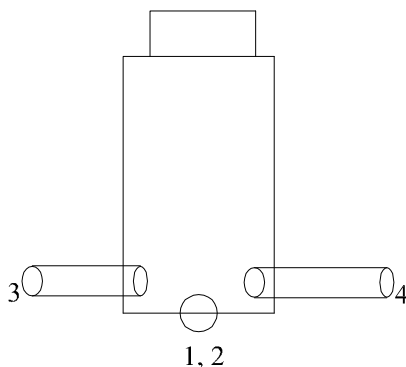

Horizontalinis

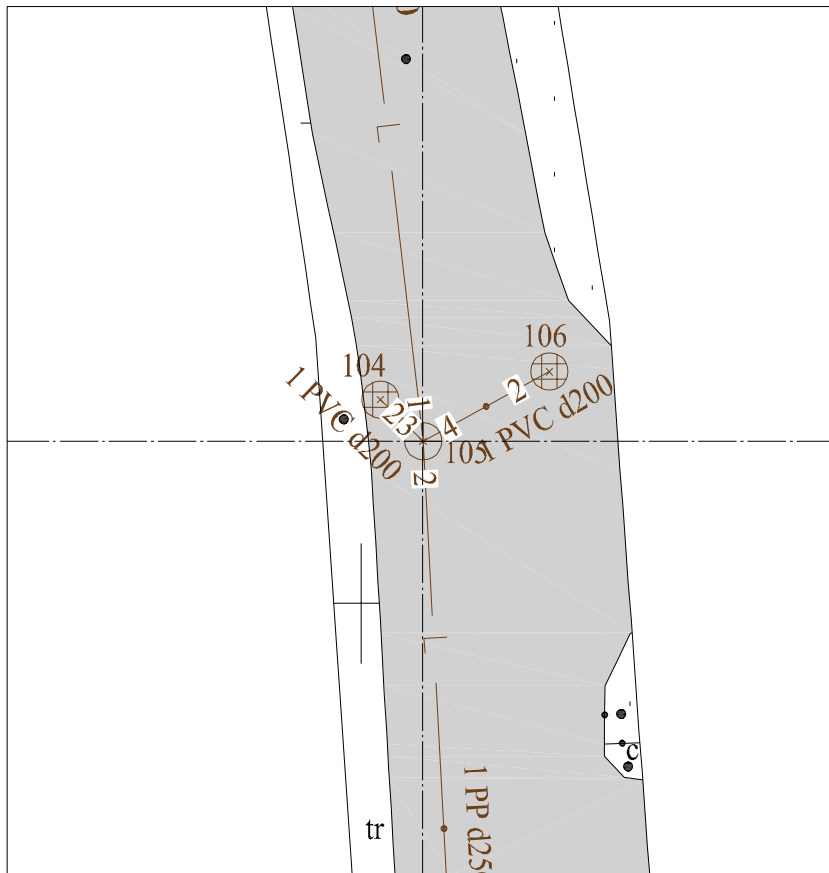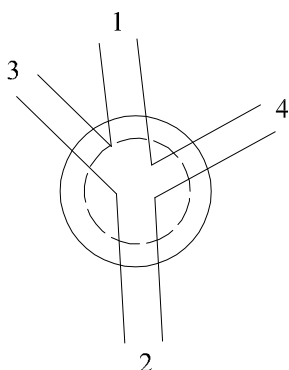

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				214.18	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė					0.00		214.18	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1000		0.57		213.61	X = 6058424.99; Y = 584190.52		
Dugnas		bet	1000		1.33		212.85	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	250	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	1.45	212.73	_____		
	Nr. 2	PP	Išorinis	250	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	1.46	212.72	_____		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	1.26	212.92	_____		
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	1.26	212.92	_____		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			_____			
		Vidinis		Apačia			_____			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-1813 (geodezininko kv. pat. Nr.)	<u>thilhu</u> (parašas)	2023-04-25 (data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-221 (geodezininko kv. pat. Nr.)	<u>parašas</u> (parašas)	2023-04-25 (data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. pat. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. pat. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. pat. Nr.)	(parašas)	(data)
