

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)



96
(įrenginio numeris)

Liepkalnio g., Vilnius
(adresas)

76310137
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

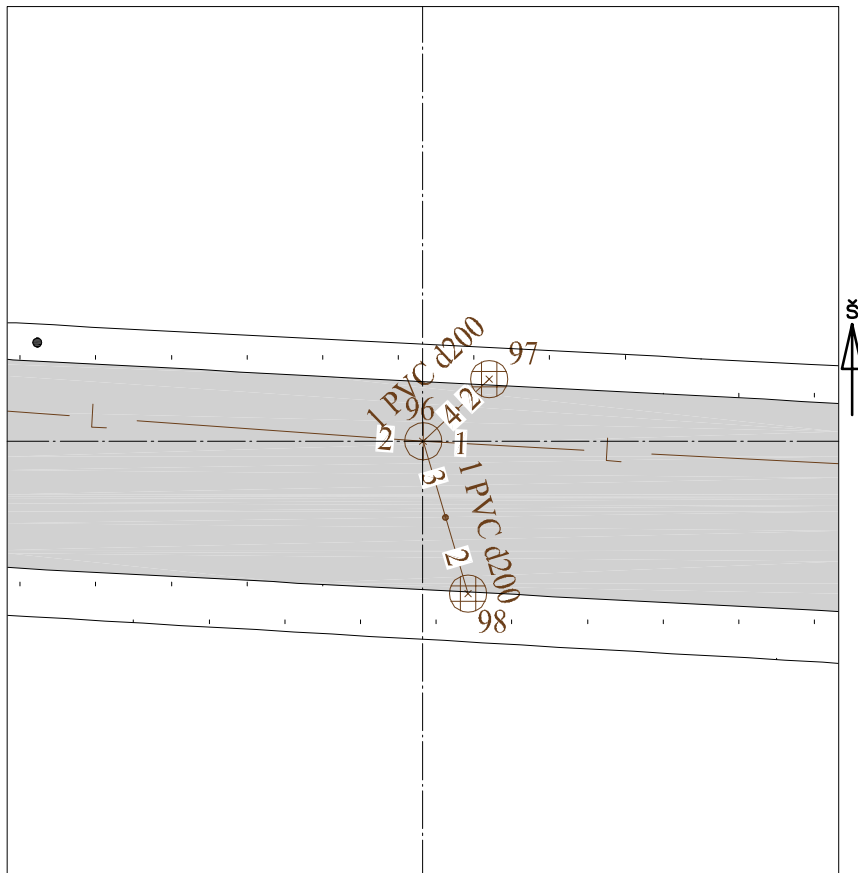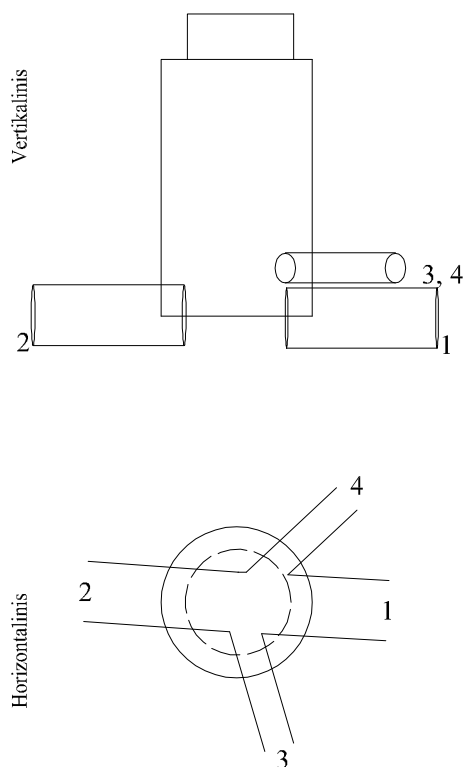

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				215.57	Ar yra vandens? Ne		
Žemė					0.00		215.57	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1000		0.71		214.86	X = 6058483.83; Y = 584138.65		
Dugnas		bet	1000		1.65		213.92			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	400	Viršus			213.72	Objektas:	
			Vidinis		Apačia	1.85				
	Nr. 2	PP	Išorinis	400	Viršus			213.72		
			Vidinis		Apačia	1.85				
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus			214.00		
			Vidinis		Apačia	1.57				
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus			213.92		
			Vidinis		Apačia	1.65				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1813 (geodezininko kv.pat.Nr.)	<i>G. Veikutytė</i> (parašas)	2023-04-25 (data)
Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-221 (geodezininko kv.pat.Nr.)	<i>D. Katilius</i> (parašas)	2023-04-25 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.pat.Nr.)	(parašas)	(data)
