

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

2
(įrenginio numeris)

Metalo g., Vilnius


(adresas)

76310307
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis

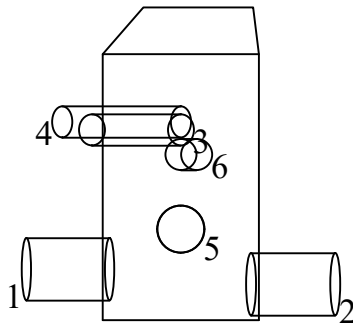

Horizontalinis

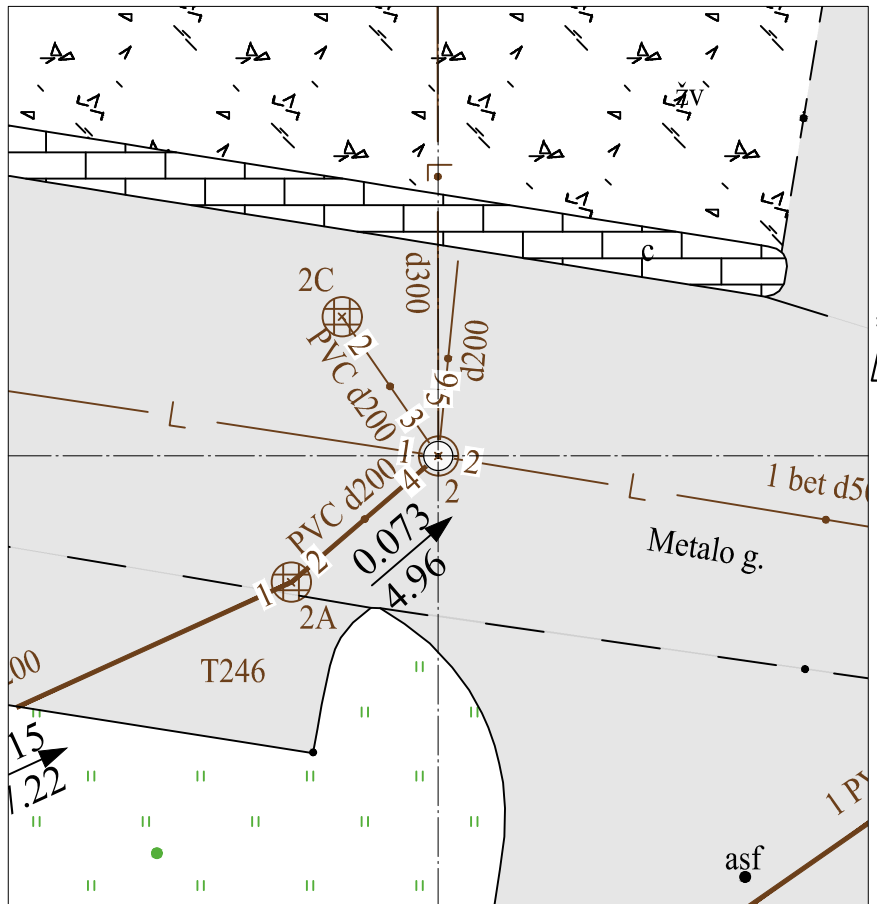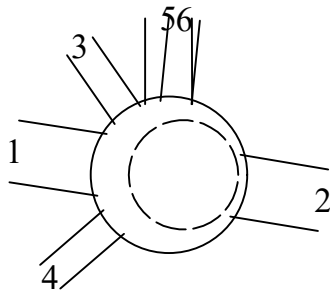

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>met, 7</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: <u>X = 6056038.70; Y = 581678.16</u>		
Dangtis		ket	700				191.20			
Žemė		asf			0.00		191.20			
Sienos		bet								
Lubos		bet								
Dugnas		bet	1000		3.53		187.67	Objektas: 		
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis	500	Viršus	2.81	188.39			
			Vidinis		Apačia	3.31	187.89			
	Nr. 2	bet	Išorinis	500	Viršus	2.98	188.22			
			Vidinis		Apačia	3.48	187.72			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.36	189.84			
			Vidinis		Apačia	1.56	189.64			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.27	189.93			
			Vidinis		Apačia	1.47	189.73			
	Nr. 5	nežinoma	Išorinis	300	Viršus	2.47	188.73			
			Vidinis		Apačia	2.77	188.43			
	Nr. 6	nežinoma	Išorinis	200	Viršus	1.64	189.56			
			Vidinis		Apačia	1.84	189.36			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					

Matavimus atliko	Tomas Pakalnis (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1634 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-09-28 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
