Gam. vandentiekio siurblinė | Nr.(____) (abrise) 32a (plane) | KORTELĖ 147-D-13 (planšeto nomenklatūra)

1999 (įrenginio pastatymo metai) | Vilnius (miestas) | VE-3 teritorijoje (gatvė)

PIŪVIAI:

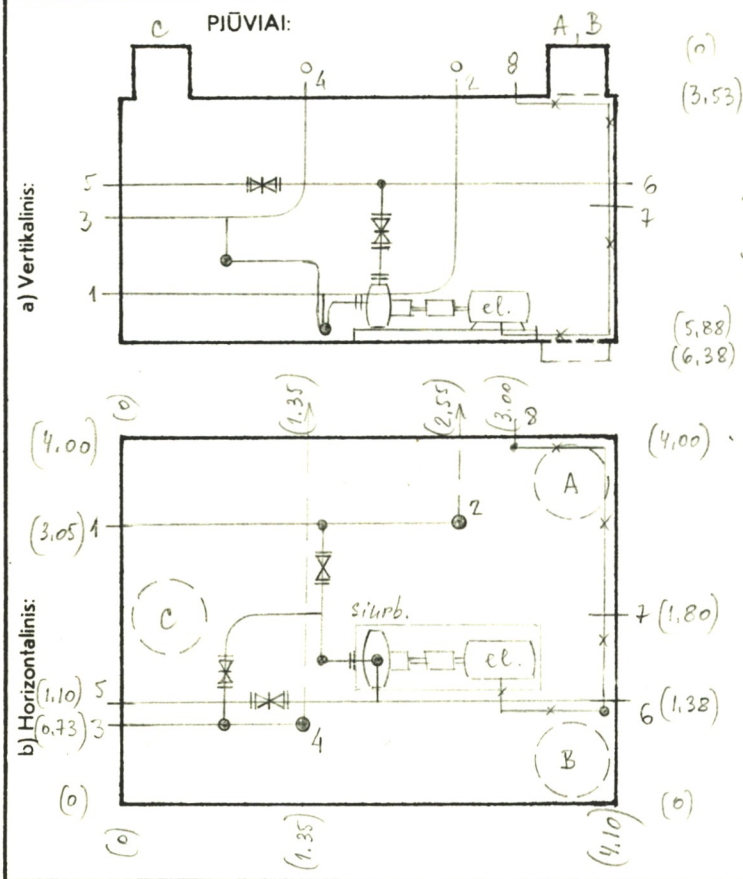

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:

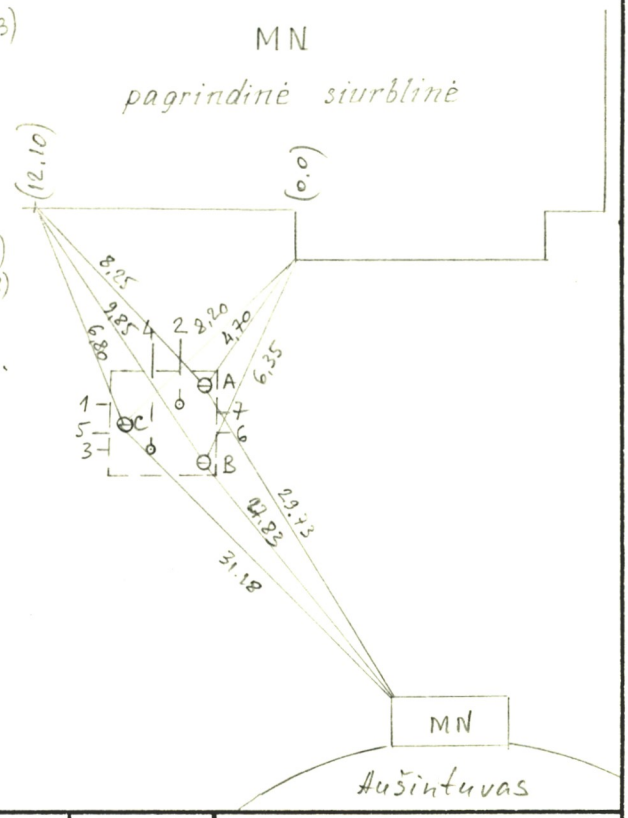

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmenys mm.	Atst. nuo dangčio m	Altitudės
Dangtis		bet.	650		A-134,20
Žemė					
Sienos		bet.			
Dugnas		bet.		5,88	128.32
Krypties Nr.	Vamzd. Nr.				
	1	plien.	400	5.13	129.07
	2	plien.	400	3.53	130.67 →
	3	plien.	400	4.21	129,99
	4	plien.	400	3,53	130.67 →
	5	plien.	150	4.06	130.14
	6	plien.	150	4,06	130.14
	7	plien.	80	4.16	130.04
	8	elektros kabelis		3.53	130.67 →

Lipynės met. kopečios (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? —

Pastabos: 1) Atstumai duoti iki vamzdžių viršaus

2) B - 134,42

C - 134.30

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-41331

Sudarė	V. Gončarov (pavardė)	(parašas)
Patikrino	H. Jasiukevičius (pavardė)	(parašas)

1989 m. 10 mėn. 27 d. (įrenginio tyrinėjimo data)

ITI 182 b

Sp.ITI-84
