41 ITI Nr. 91[a]

F. Kanalizacija (Komunikacija) | Šulinys (Įrenginio pavadinimas) | Nr. (18) ~~1219~~ KORTELĖ

Vilnius (Miestas) | Montvilos (Gatvė) | ~~4894~~ 151-C-5 (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

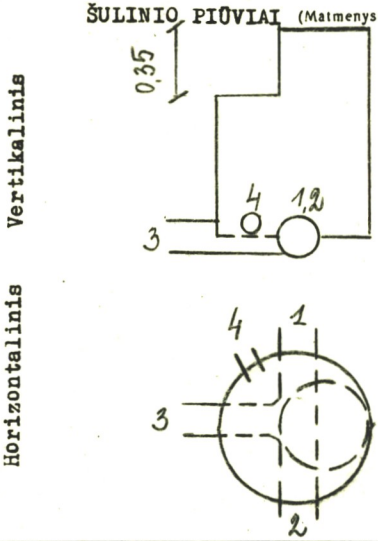

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

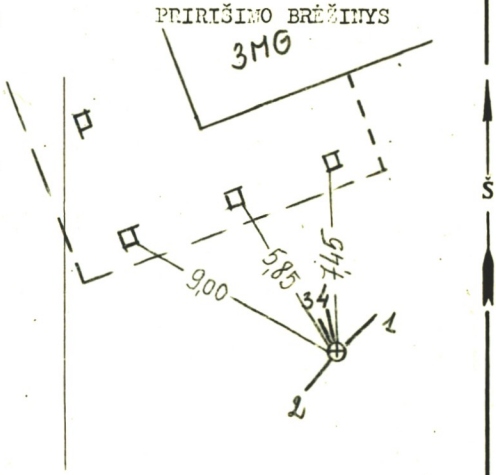

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ketaus	640			141,389
Žemė				0		141,389
Sienos		betono				
Dugnas		betono	1000	1,62		139,76
Vamzdžiai	Nr. 1	keram	150	Viršus / Apačia	1,75	139,63
	Nr. 2	keram	150	Viršus / Apačia	1,75	139,63
	Nr. 3	ketaus	150	Viršus / Apačia	1,72	139,66
	Nr. 4	ketaus	100	Viršus / Apačia	1,62	139,76
	Nr. 5			Viršus / Apačia		
	Nr. 6			Viršus / Apačia		
	Nr. 7			Viršus / Apačia		

Lipynės ..... (Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? .....

Ar yra dujų? .....

Pastabos .....

.....

.....

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-2-2520....

Sudarė (parašas) Mašleinis (pavardė)

Patikrino (parašas) Apkauskas (pavardė)

1978 m. 12 mėn. 07 d.

(Įrenginio tyrinėjimo data)
